

FONTANEL- LE 180°

69 LA MULATIERE

BALCONS DU NIVEAU N+1
BAT A



EXE

Indice	Date	Designation des Modifications	Date :
A			01/02/2016
B			Affaire :
C			
D			Echelle :
E			
F			
G			
H			
I			

Type béton = B35 XF1
Aciers H.A et T.S = Fe E 500
Enrobage des armatures = ENR_CARMAT
Manutention = Tonnes

BUREAU D'ETUDE
PLATTARD SAS
414 Avenue de la
plage
BP 119
69540
Villefrance-sur-Saône
Tél: 04 74 02 20 20
Fax: 04 74 62 26 62



Ce plan est la propriété intellectuelle de la PLATTARD SAS, il ne peut être reproduit sans son autorisation.

NOAHO
LE 180°
Chemin de Fontanière - 69350 La Mulatière
Création de logements

Les entreprises réalisant les travaux devront tenir compte des derniers plans architecte lors de la réalisation des travaux
Les plans du be MATTE ne doivent servir qu'au corps d'état concerné et doivent être des plans d'exécution.

ARCHITECTE(S): ATELIER DE LA PASSERELLE
BET STRUCTURE: MATTE SAS
BET FLUIDES: PRELEM
ECONOMISTE: EXECO
BUREAU DE CONTROLE: Bureau VERITAS

MO DELEGUE:
MOE: PSO Ingénierie
CSPS: SUD EST COORDINATION
OPC:
ENTREPRISE(S): Fontanel

Bât:A
PLANCHER SUR 1er
Coffrage

EXE

Contrainte de sol: 8 bars ELS

Aciers HA (T) FeE500
Aciers Doux (Ø) FeE 235
Aciers TS FeE 500
Béton fc28 >= 25MPa
Enrobage = 3 cm

PLAN N°
A46 0

DATE : 29/02/2016

MATTÉ
BUREAU D'ÉTUDES
STRUCTURES ET FLUIDES


119 BOULEVARD STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE
Tél. 04 72 44 02 87 Fax 04 72 44 26 59
E-mail : bet@matte.fr

Dessiné par : J.BO
Contrôlé par : P.LIN
Echelle : 1/50°

Affaire N°
13.12.118


Plancher Niveau R+1

BAT. A

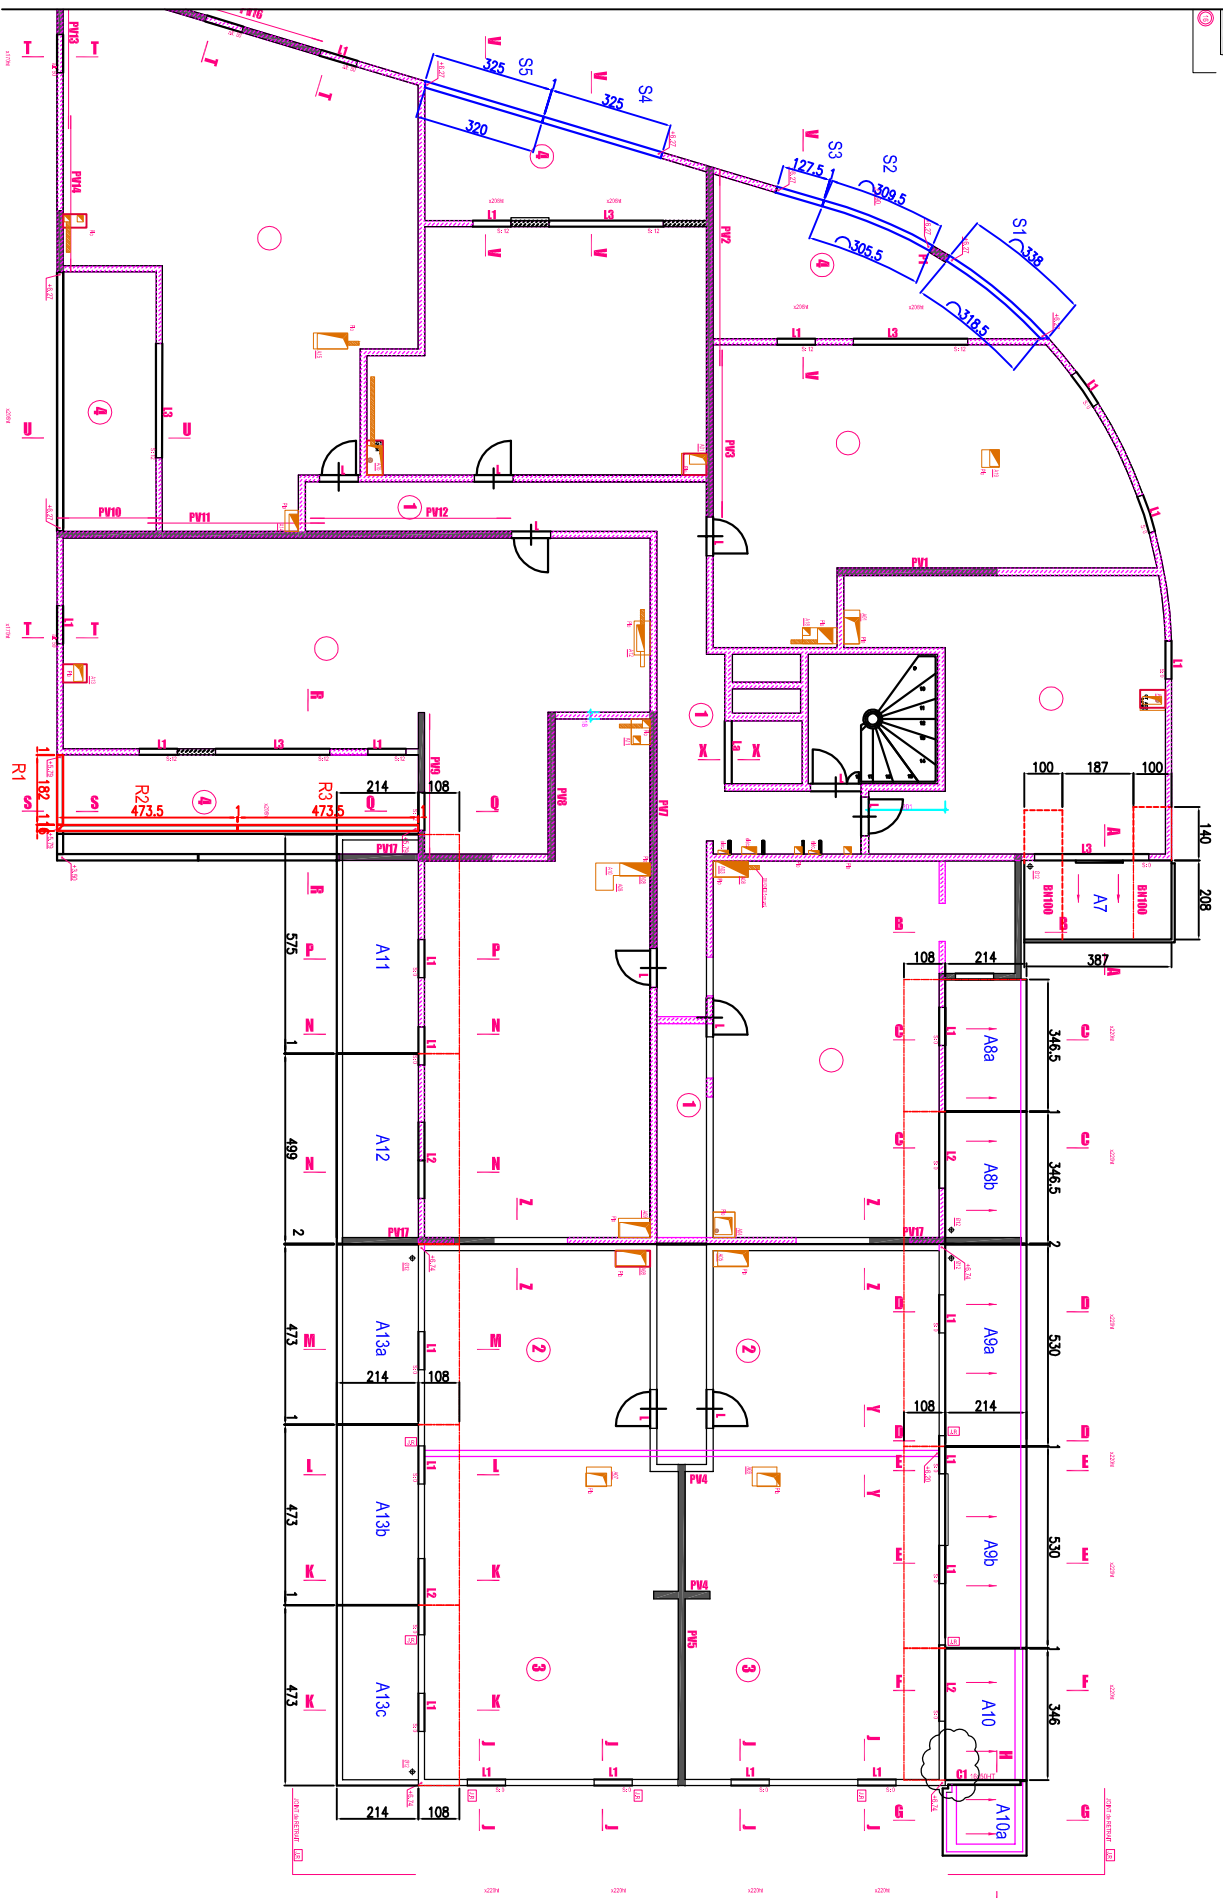

MOULE	N	NC	observations	CONTROLE	N	NC	observations	BETON	N	NC	observations	FICHE AUTO-CONTROLE
Conformité moule				Dimensions				Conformité béton				Opérateur :
Etat du moule				Armature				Mise en place				Responsable prod :
Propreté et huilage				Inserts				Aspect de surface				Date :

FONTANEL				 PLATTARD S.A.S.		COUPE TYPE					
LA MULATIERE		Elément: BALCONS coffrage / ferrallage				Surface: m²		POIDS		REPERE	
						Volume: m3		T			

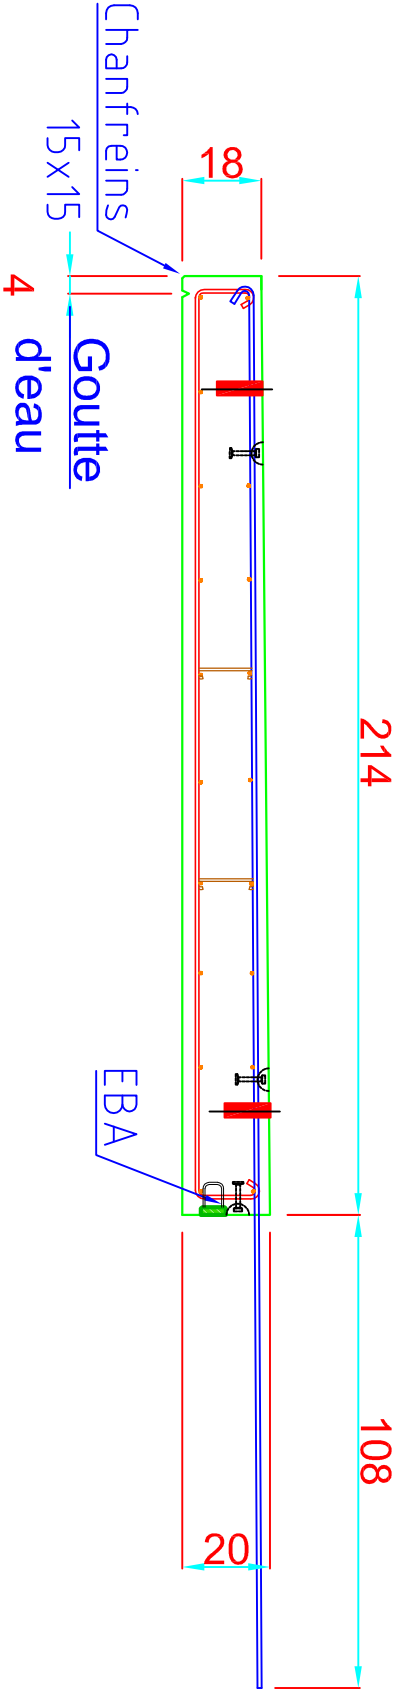

LEVAGE			INSERTS			INSERTS			INSERTS		
	Douille Ø			Ancre Frimeda T			EBA			TP - JV	DATE: 05/11/2015
	Douille Ø			Renfort Ø			Douille étalement			PVC Ø80	Plan N°
	Renfort Ø dx			Trifler			Ankrobox Ø50			Tube garde-corps	Indice


FILANT HA8

HA12 e = 20

HA8 e = 20

MOULE	N	NC	observations	CONTROLE	N	NC	observations	BETON	N	NC	observations	FICHE AUTO-CONTROLE
Conformité moule				Dimensions				Conformité béton				Opérateur :
Etat du moule				Armature				Mise en place				Responsable prod :
Propreté et huilage				Inserts				Aspect de surface				Date :


Ent. FONTANEL			Elément: BALCONS			PLAN DE FABRCATION			Surface: 7.41 m²	POIDS	REPERE	Nbr
LA MULATIERE			coffrage / ferrillage			PLATTARD S.A.S.			Volume: 1.41 m3	3.39 T	A8b 1	

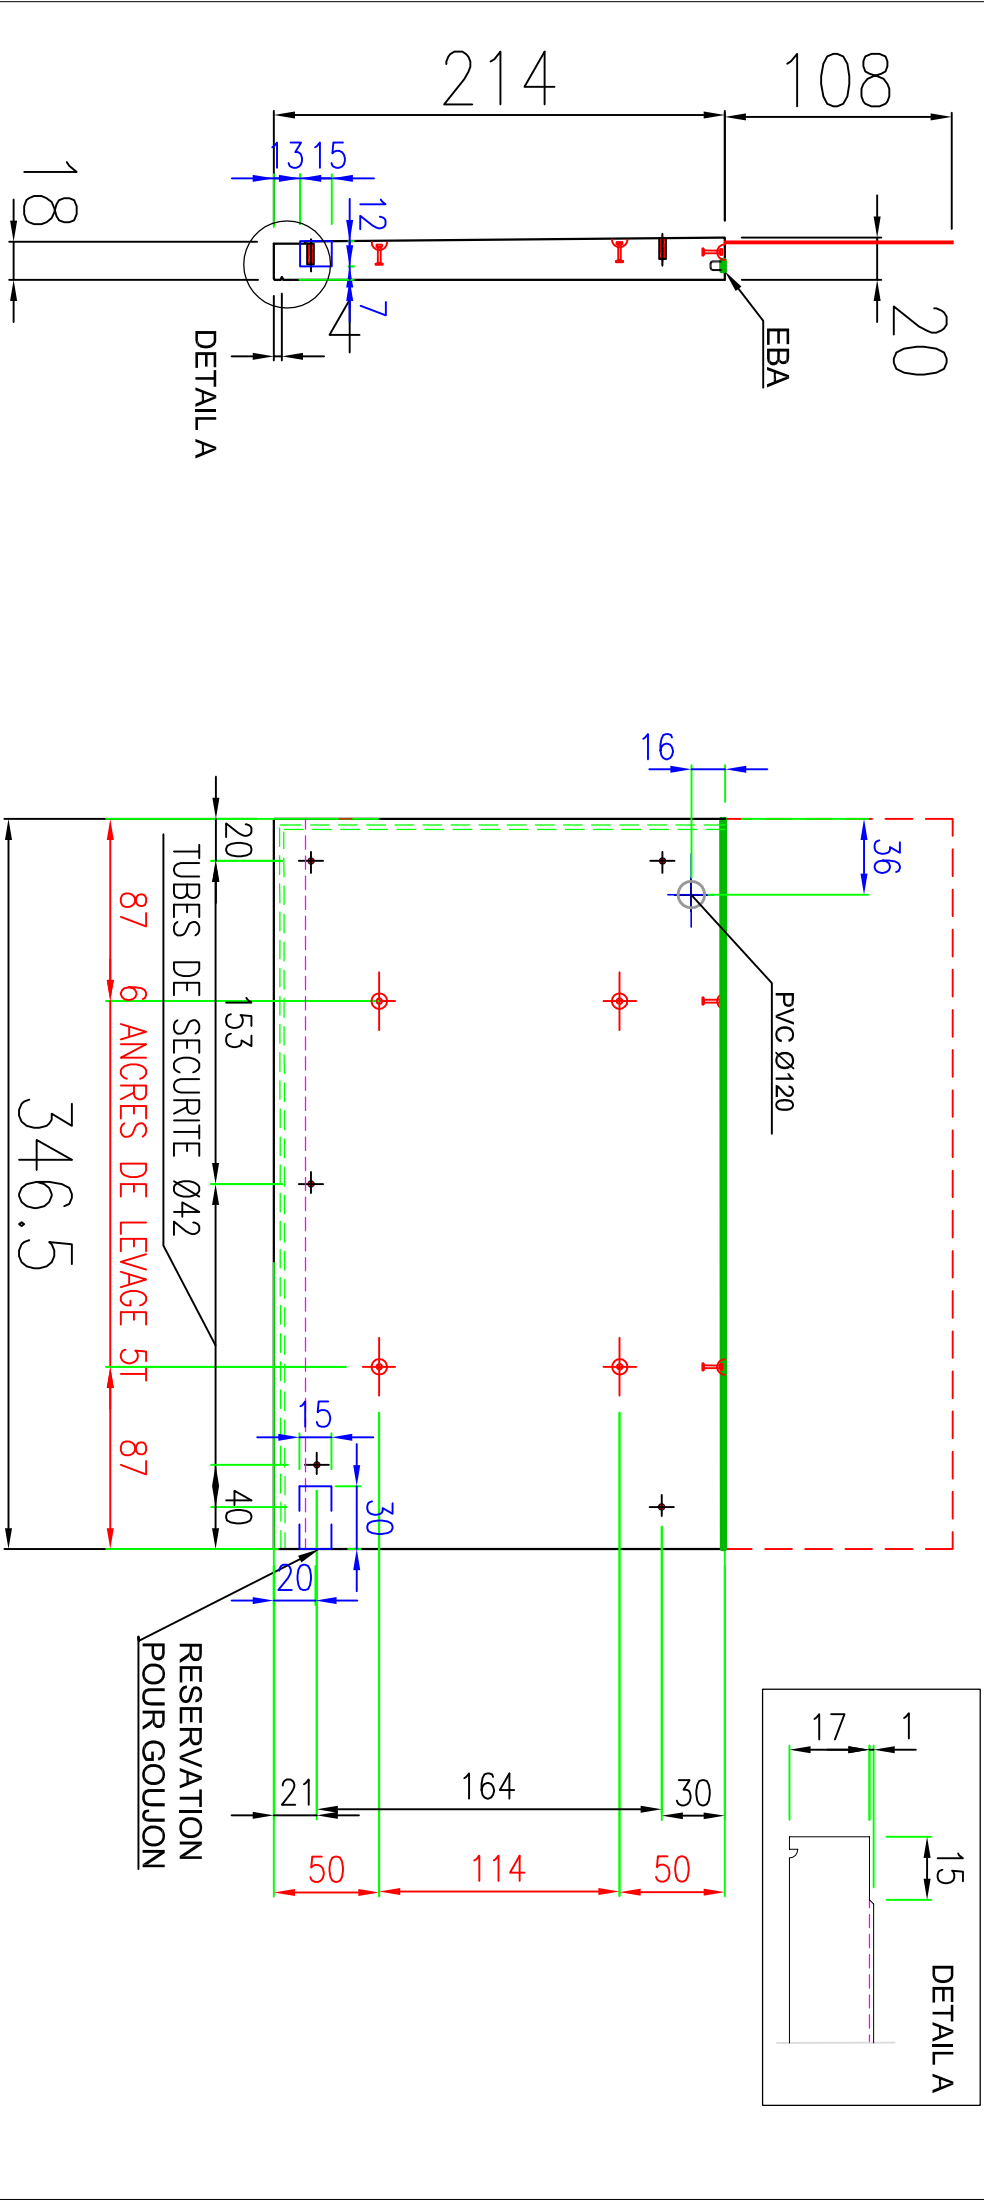

LEVAGE		INSERTS		INSERTS		INSERTS		INSERTS	
	Douille Ø		Ancre Frimeda T		EBA		TP - JV		DATE: 11/12/2015
	Douille Ø		Renfort Ø		Douille étalement		PVC Ø80		Plan N°
	Renfort Ø dx		Trifler		Ankrobox Ø50		Tube garde-corps		Indice
								Page N°	

MOULE	N	NC	observations	CONTRÔLE	N	NC	observations	BETON	N	NC	observations	FICHE AUTO-CONTROLE
Conformité moule				Dimensions				Conformité béton				Opérateur :
Etat du moule				Armature				Mise en place				Responsable prod :
Propreté et huilage				Inserts				Aspect de surface				Date :

Ent. FONTANEL				 PLATARD S.A.S.		PLAN DE FABRCATION							
LA MULATIERE		Elément: BALCONS				Surface: 11.35 m²		POIDS		REPERE		Nbr	
		coffrage / ferrallage				Volume: 2.16 m3		5.18 T		A9a		1	

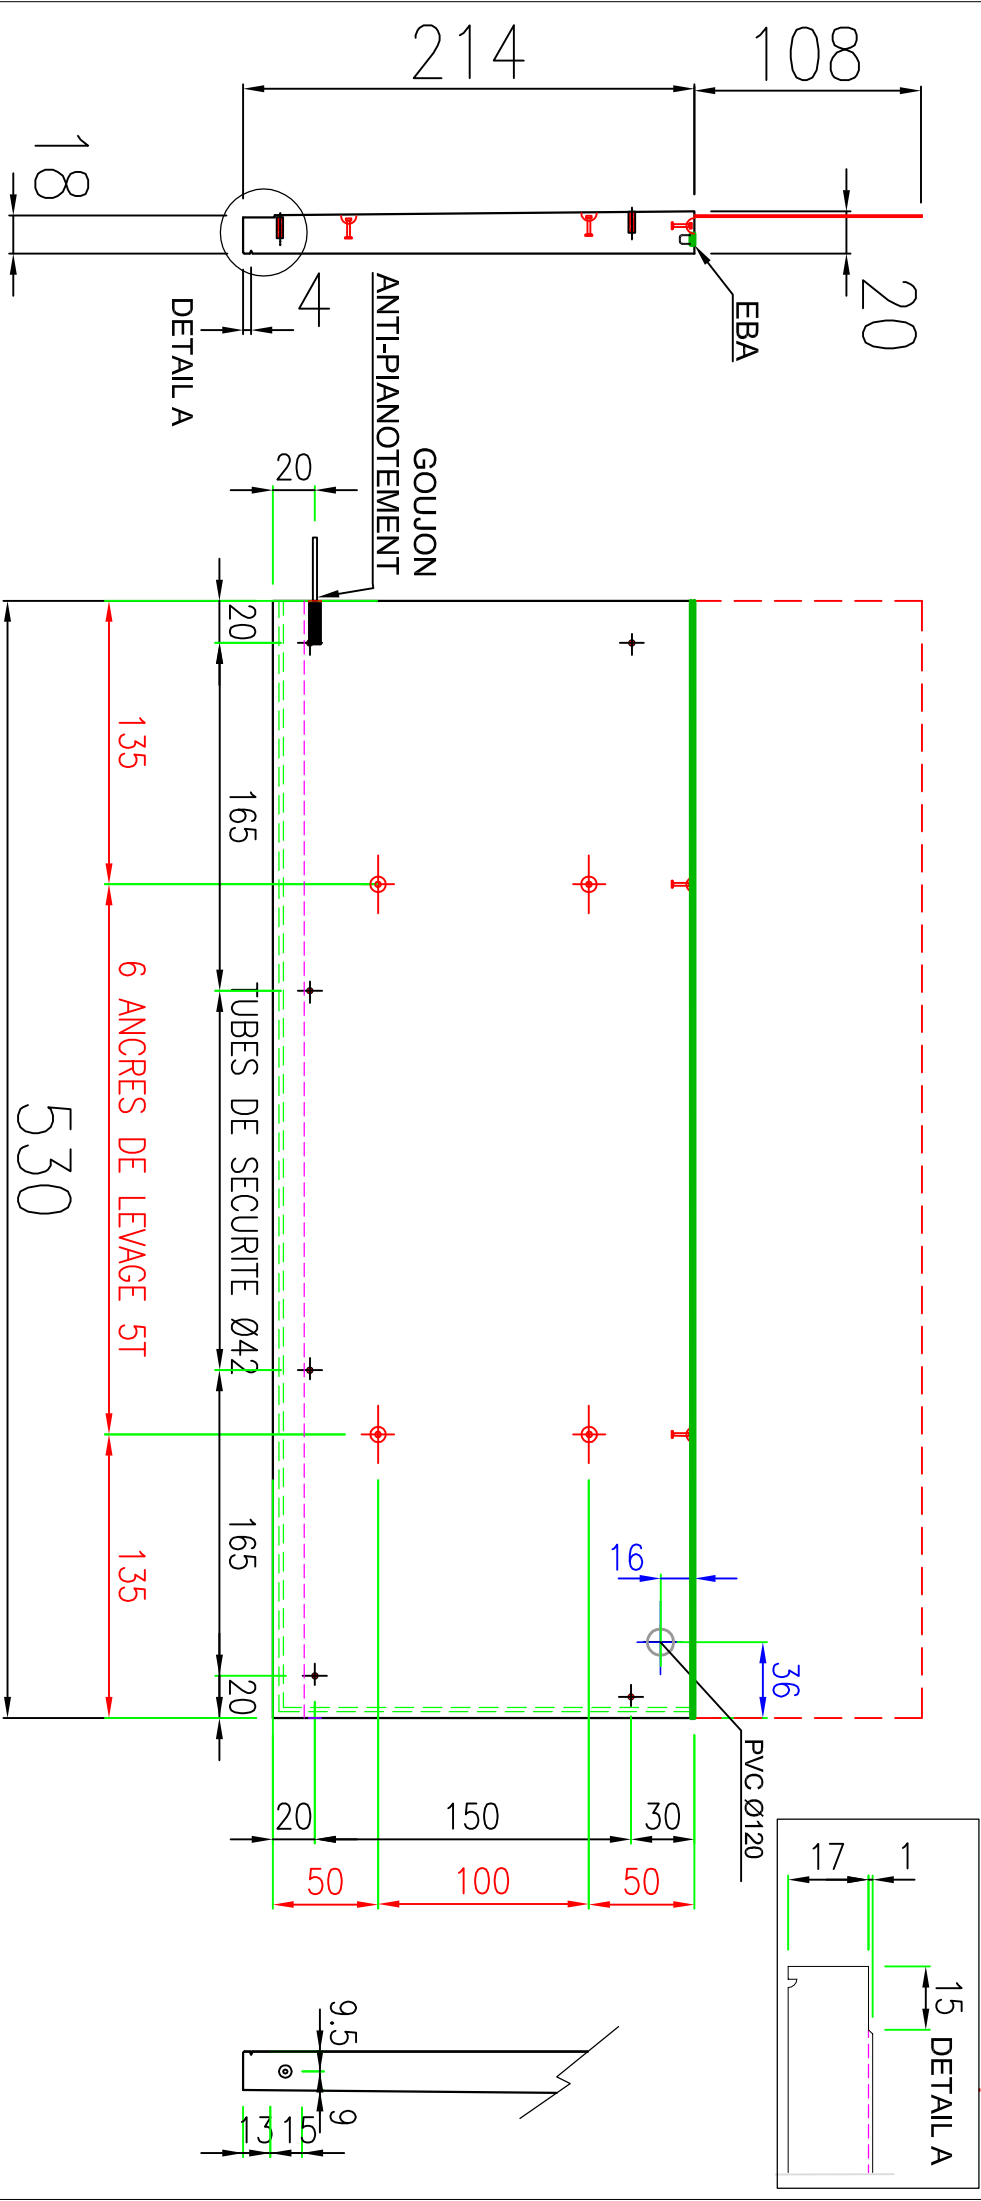


LEVAGE			INSERTS			INSERTS			INSERTS			INSERTS			INSERTS		
	Douille Ø			Ancre Frimeda T			EBA			TP - JV			Douille étalement			PVC Ø80	
	Douille Ø			Renfort Ø			Ankrobox Ø50			Tube garde-corps			Indice			Plan N°	
	Renfort Ø	dx		Trifler												Page N°	

DATE: 16/11/2015

Page N°

MOULE	N	NC	observations	CONTRÔLE	N	NC	observations	BETON	N	NC	observations	FICHE AUTO-CONTROLE
Conformité moule				Dimensions				Conformité béton				Opérateur :
Etat du moule				Armature				Mise en place				Responsable prod :
Propreté et huilage				Inserts				Aspect de surface				Date :


Ent. FONTANEL			Elément: BALCONS			PLAN DE FABRCATION			Surface:	11.35 m²	POIDS	REPERE	Nbr
LA MULATIERE			coffrage / ferrillage			PLATTARD S.A.S.			Volume:	2.16 m3	5.18 T	A9b	1

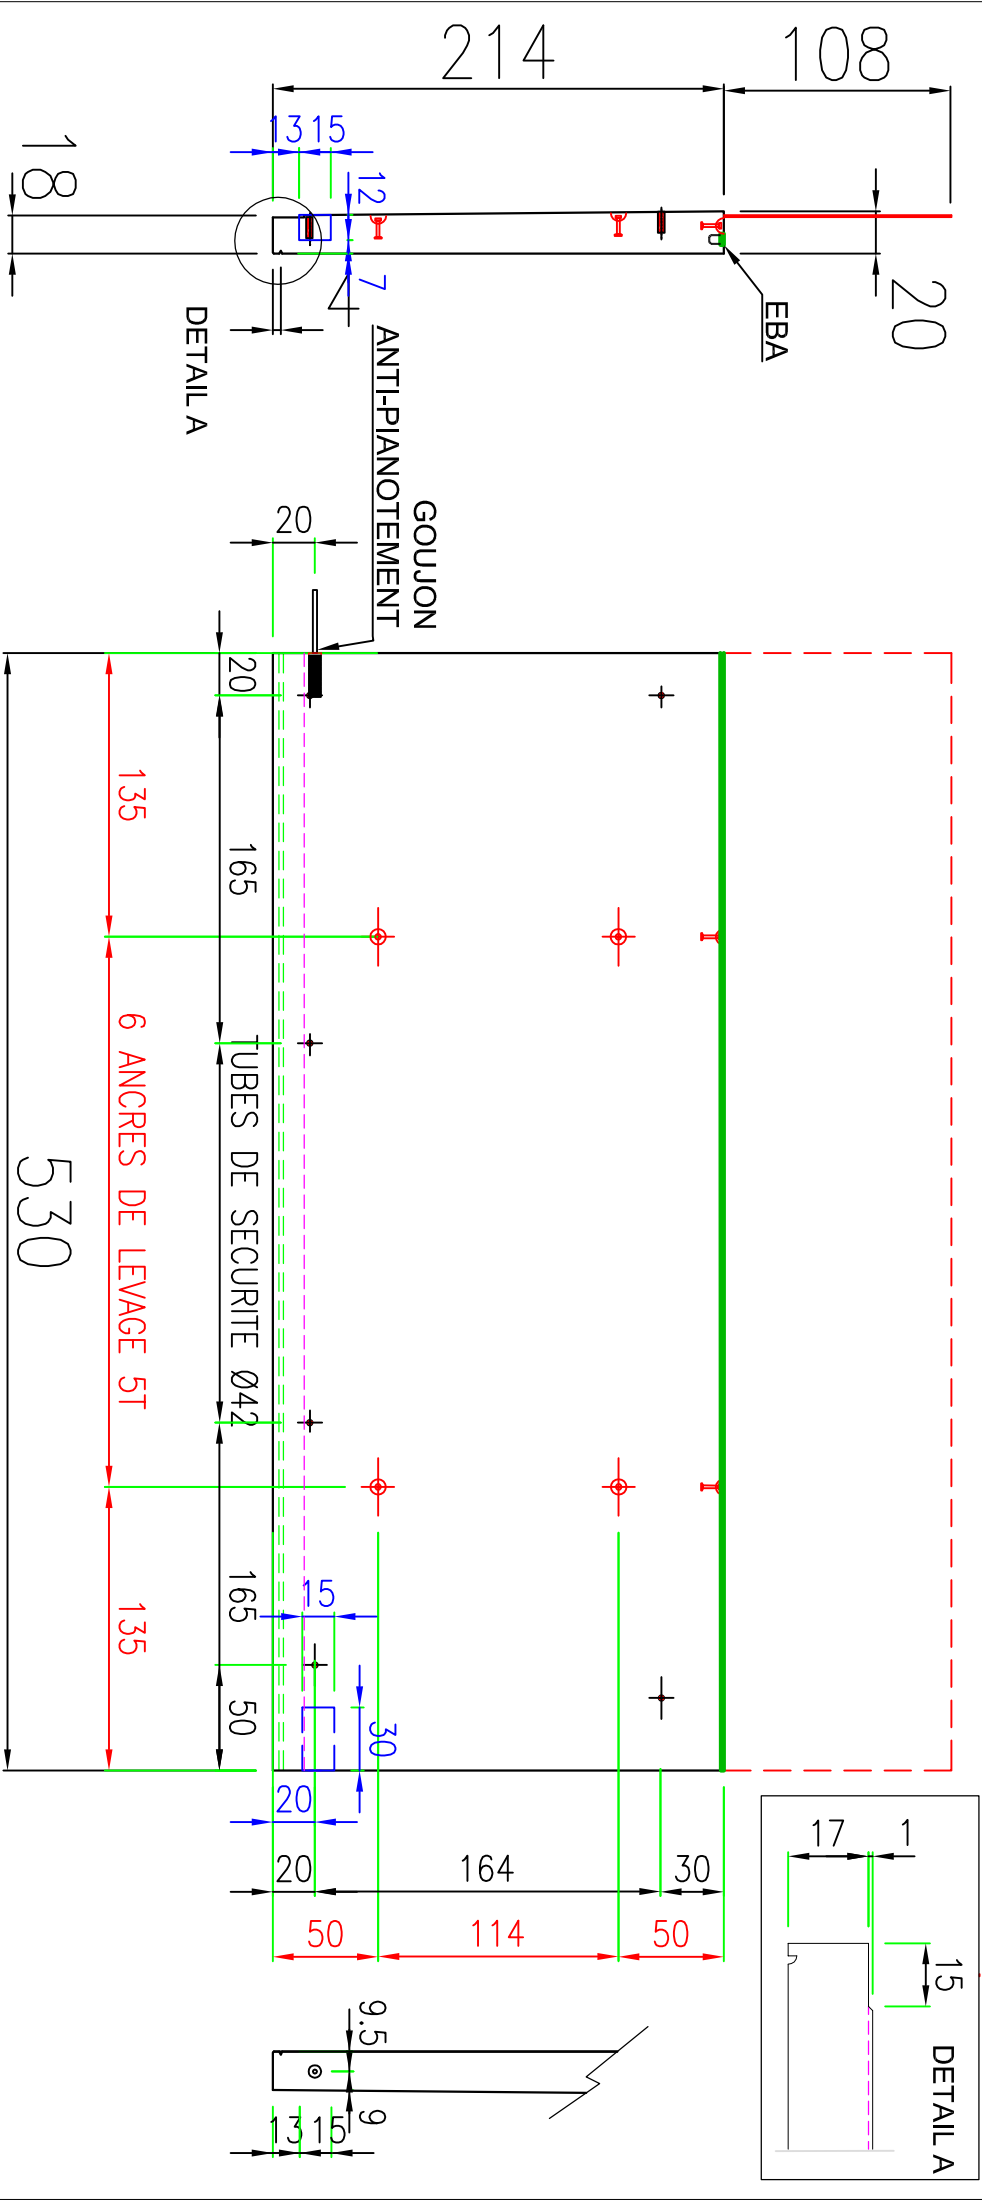

LEVAGE									
	Douille Ø		Ancre Frimeda T		EBA		TP - JV	DATE: 16/11/2015	
	Douille Ø		Renfort Ø		Douille étalement		PVC Ø80	Plan N°	Page N°
	Renfort Ø dx		Trifier		Ankrobox Ø50		Tube garde-corps	Indice	
INSERTS									
	Λ								

MOULE	N	NC	observations	CONTROLE	N	NC	observations	BETON	N	NC	observations	FICHE AUTO-CONTROLE
Conformité moule				Dimensions				Conformité béton				Opérateur :
Etat du moule				Armature				Mise en place				Responsable prod :
Propreté et huilage				Inserts				Aspect de surface				Date :


Ent. FONTANEL		Elément: BALCONS		 PLATTARD S.A.S.		PLAN DE FABRCATION		Surface: 7.40 m²		POIDS		REPERE		Nbr	
LA MULATIERE		coffrage / ferrailage				Volume: 0.69 m3		1.66 T		A10		1			

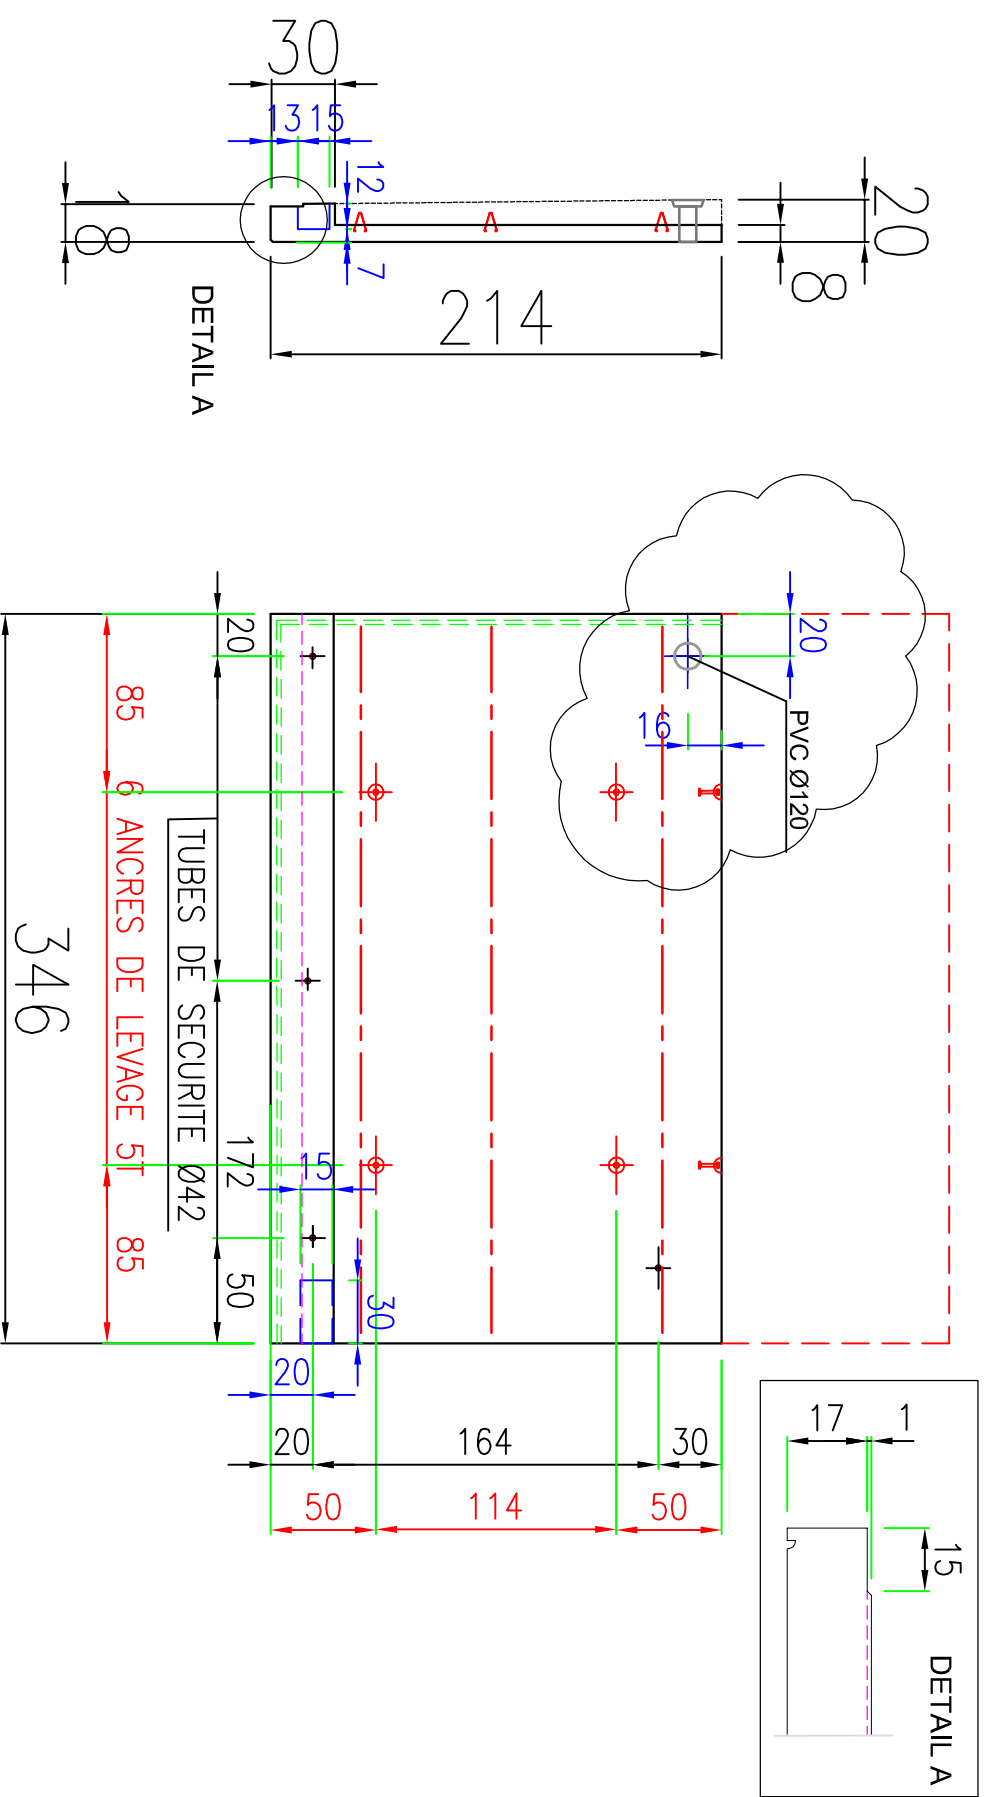

LEVAGE				INSERTS				INSERTS				INSERTS				DATE: 16/11/2015			
	Douille Ø				Ancre Frimeda T				EBA				TP - JV			Page N°			
	Douille Ø				Renfort Ø				Douille étalement				PVC Ø80						
	Renfort Ø dx				Trifler				Ankrobox Ø50				Tube garde-corps			Indice			

MOULE	N	NC	observations	CONTRÔLE	N	NC	observations	BETON	N	NC	observations	FICHE AUTO-CONTROLE
Conformité moule				Dimensions				Conformité béton				Opérateur :
Etat du moule				Armature				Mise en place				Responsable prod :
Propreté et huilage				Inserts				Aspect de surface				Date :

Ent. FONTANEL			Elément: BALCONS			PLAN DE FABRCATION			POIDS			REPERE	Nbr
LA MULATIERE			coffrage / ferrailage			Surface: 4.30 m²			2.00 T			A10a	1
						Volume: 0.82 m3							

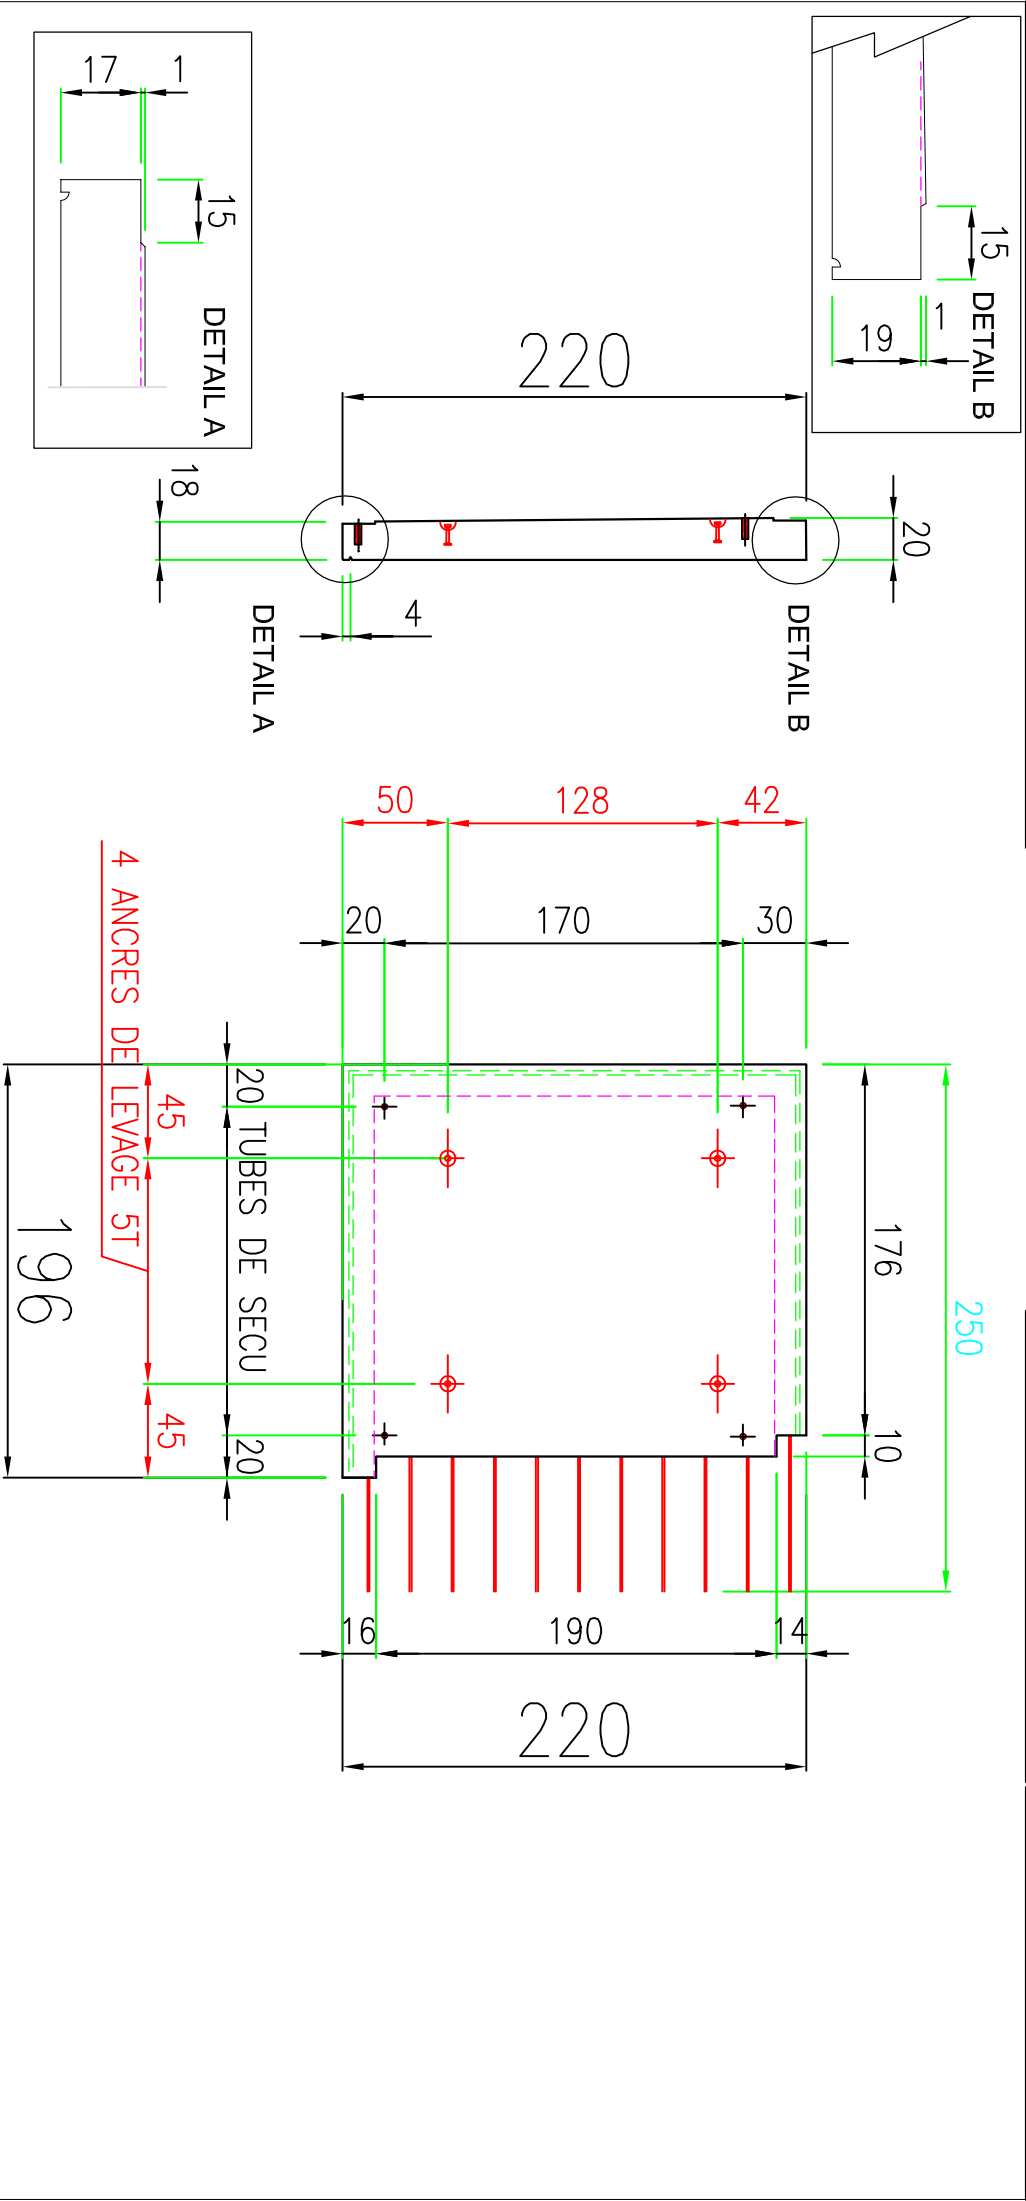


EVAGE			INSERTS			INSERTS			INSERTS			DATE: 16/11/2015		
	Douille Ø			Ancre Frimeda T			EBA			TP - JV				
	Douille Ø			Renfort Ø			Douille étalement			PVC Ø80		Page N°		
	Renfort Ø			Trifar			Ankrhov Ø50			Tuba nardacorns				

MOULE	N	NC	observations	CONTROLE	N	NC	observations	BETON	N	NC	observations	FICHE AUTO-CONTROLE
Conformité moule				Dimensions				Conformité béton				Opérateur :
Etat du moule				Armature				Mise en place				Responsable prod :
Propreté et huilage				Inserts				Aspect de surface				Date :

Ent. FONTANEL			Elément: BALCONS			Surface: 10.2 m²			POIDS			REPÈRE	Nbr
LA MULATIERE			coffrage / ferrillage			Volume: 1.92 m3			4.65 T			A13a	1



PLAN DE FABRCATION


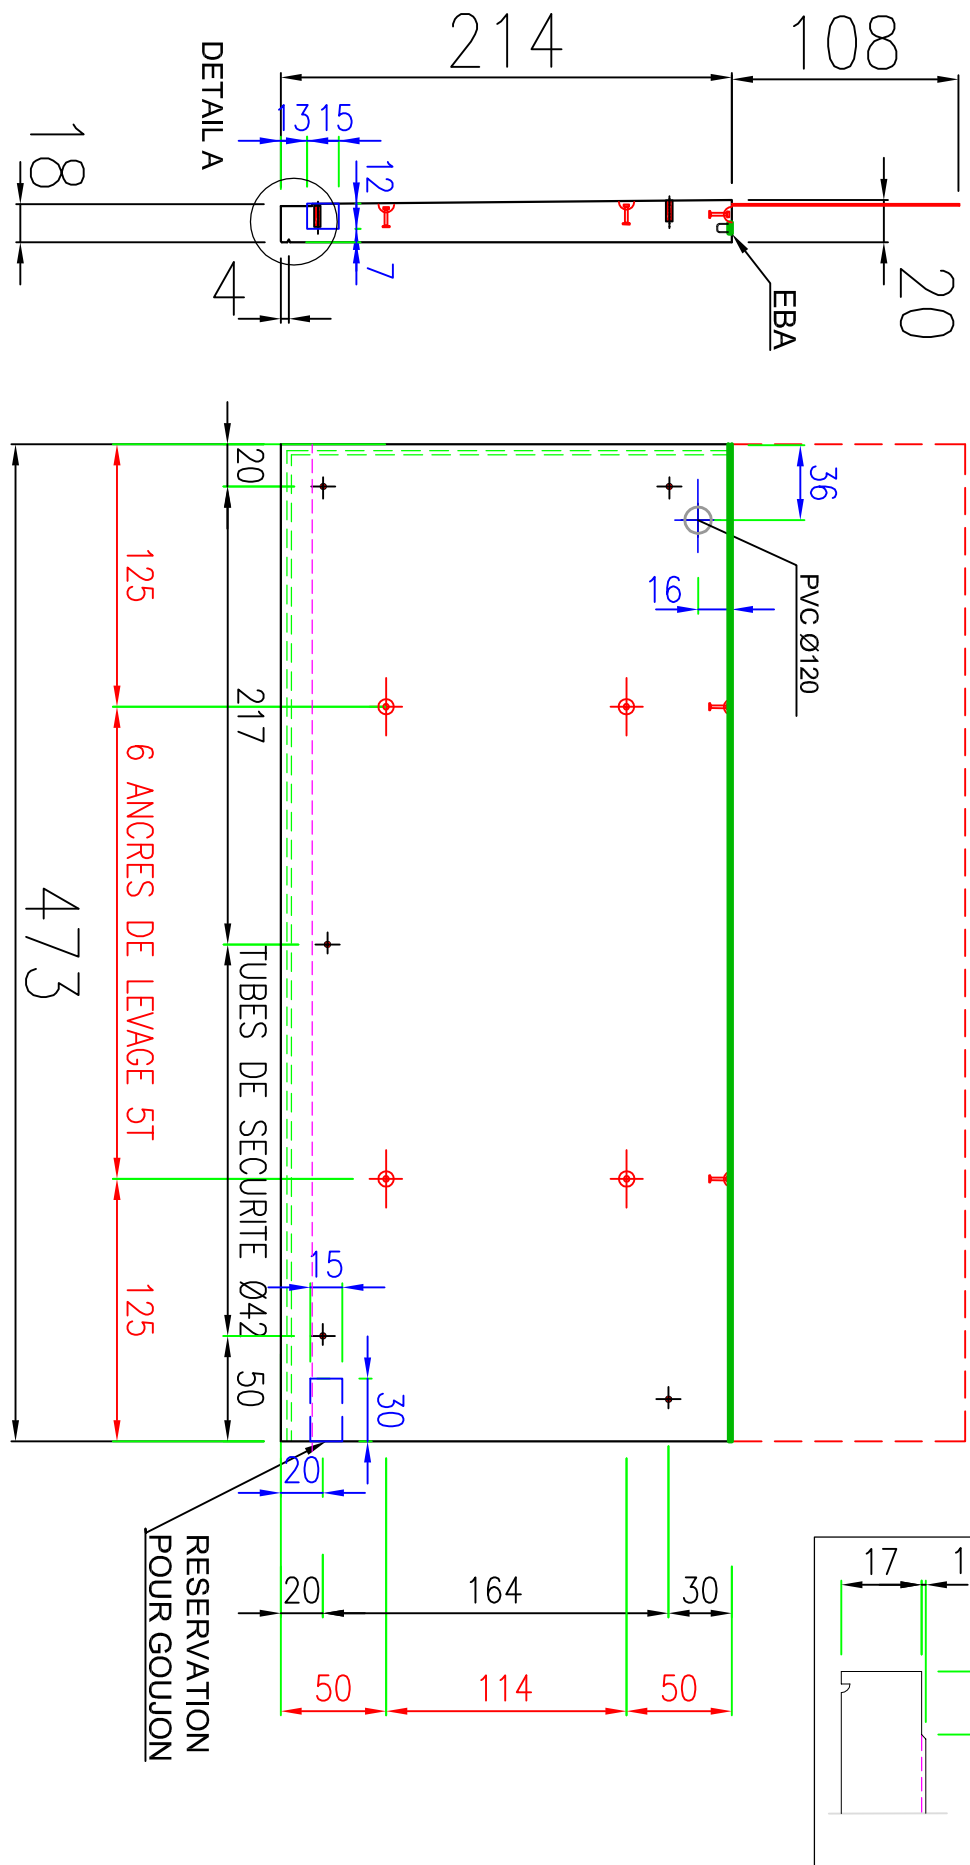


LEVAGE		INSERTS		INSERTS		INSERTS		INSERTS		DATE: 16/11/2015	
	Douille Ø		Ancre Frimeda T		EBA		TP - JV		PVC Ø80	Plan N°	Page N°
	Douille Ø		Renfort Ø		Douille étalement		PVC Ø80		Tube garde-corps	Indice	
	Renfort Ø dx		Trifier		Ankrobox Ø50		Tube garde-corps				

LE 180 - LA MULATIERE

BANDEAU TYPE R

NIVEAU 1

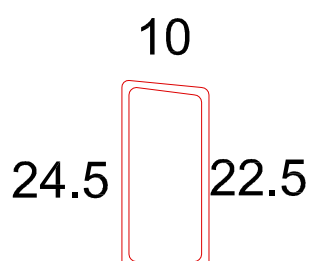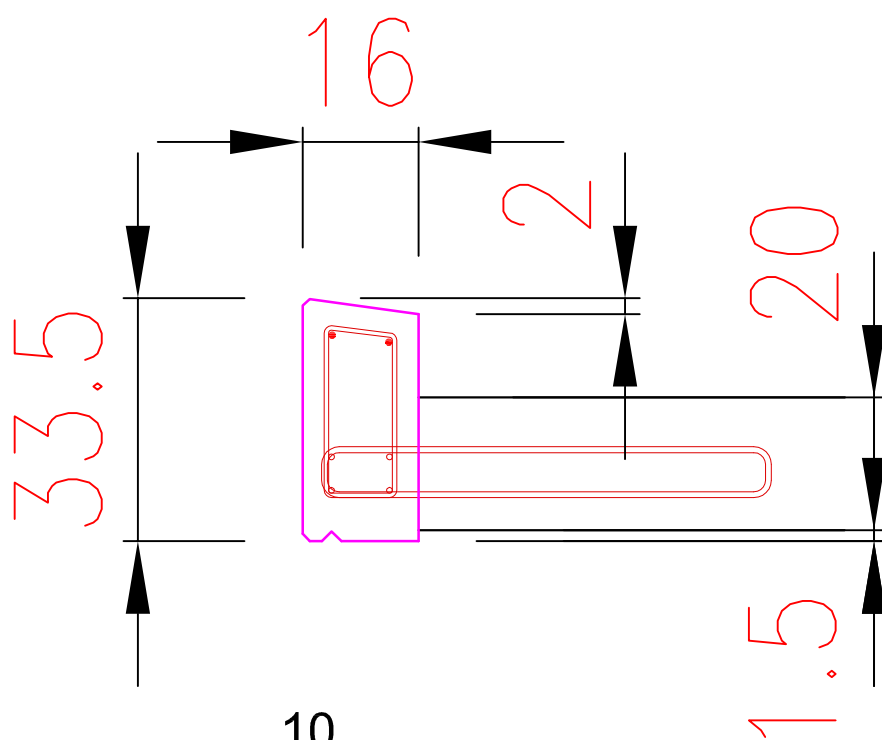

Cadres HA6 e=20



2 Filants HA10




4 Filants HA8





Attentes Ø8dx

MOULE	N	NC	observations	CONTROLE	N	NC	observations	BETON	N	NC	observations	FICHE AUTO-CONTROLE
Conformité moule				Dimensions				Conformité béton				Opérateur :
Etat du moule				Armature				Mise en place				Responsable prod :
Propreté et huilage				Inserts				Aspect de surface				Date :

Ent. FONTANEL						REPERE		Nbr			
LA MULATIERE		Elément: BANDEAUX		 PLATTARD S.A.S. FICHE DE FABRICATION		POIDS		R1		1	
		coffrage									
				Volume: 0.10 m3		0.24 T					



Levage 2 douilles ø16


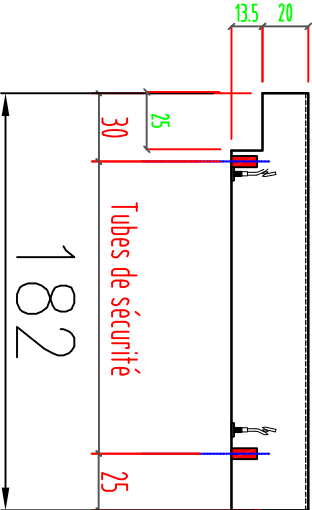



LEVAGE									
	Douille Ø		DATE: 07/04/2015 Page N°						
	Douille Ø								
	Renfort Ø dx								
INSERTS									
	Ancre Frimeda T		DATE: 07/04/2015 Page N°						
	Renfort Ø								
	Trifler								
INSERTS									
	EBA		DATE: 07/04/2015 Page N°						
	Douille étalement								
	Ankrobox Ø50								
INSERTS									
	TP - JV		DATE: 07/04/2015 Page N°						
	PVC Ø80								
	Tube garde-corps								
Indice									

MOULE	N	NC	observations	CONTROLE	N	NC	observations	BETON	N	NC	observations	FICHE AUTO-CONTROLE
Conformité moule				Dimensions				Conformité béton				Opérateur :
Etat du moule				Armature				Mise en place				Responsable prod :
Propreté et huilage				Inserts				Aspect de surface				Date :

Ent. FONTANEL		Elément: BANDEAUX		 PLATTARD S.A.S.		FICHE DE FABRICATION				POIDS		REPERE		Nbr	
LA MULATIERE		coffrage						Volume: 0.25 m3		0.61 T		R2		1	

retour d'angle

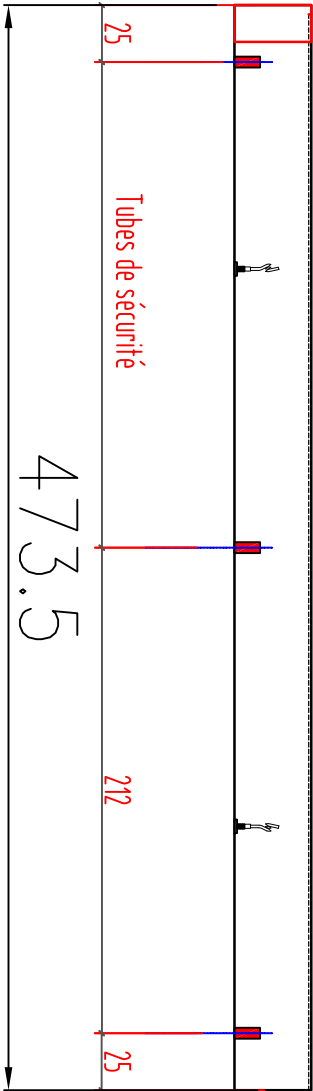

LEVAGE		Douille Ø		Ancre Frimeda T		EBA		TP - JV		DATE: 07/04/2015	
		Douille Ø		Renfort Ø		Douille étalement		PVC Ø80		Plan N°	
		Renfort Ø dx		Trifier		Ankrobox Ø50		Tube garde-corps		Indice	



INSERTS

INSERTS

INSERTS

MOULE	N	NC	observations	CONTROLE	N	NC	observations	BETON	N	NC	observations	FICHE AUTO-CONTROLE
Conformité moule				Dimensions				Conformité béton				Opérateur :
Etat du moule				Armature				Mise en place				Responsable prod :
Propreté et huilage				Inserts				Aspect de surface				Date :

Ent. FONTANEL		Élément: BANDEAUX		FICHE DE FABRICATION		POIDS		REPERE	Nbr
LA MULATIERE		coffrage				Volume: 0.25 m3		0.61 T	R31

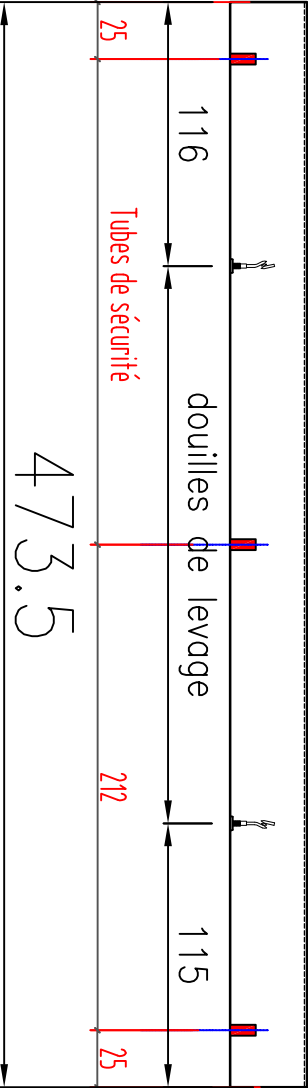


LEVAGE		INSERTS		INSERTS		INSERTS	
	Douille Ø		Ancre Frimeda T		EBA		TP - JV
	Douille Ø		Renfort Ø		Douille étalement		PVC Ø80
	Renfort Ø dx	Λ	Trifier		Ankrobox Ø50		Tube garde-corps
DATE: 07/04/2015		Plan N°		Indice		Page N°	

LE 180 - LA MULATIERE

BANDEAU TYPE S

NIVEAU 1




Cadres HA6 e=20



2 Filants HA10





6 Filants HA8

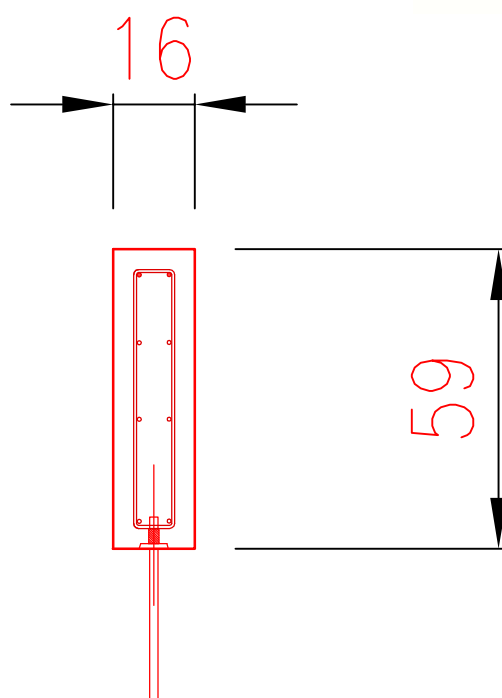

LE 180 - LA MULATIERE

BANDEAU TYPE S


NIVEAU 1

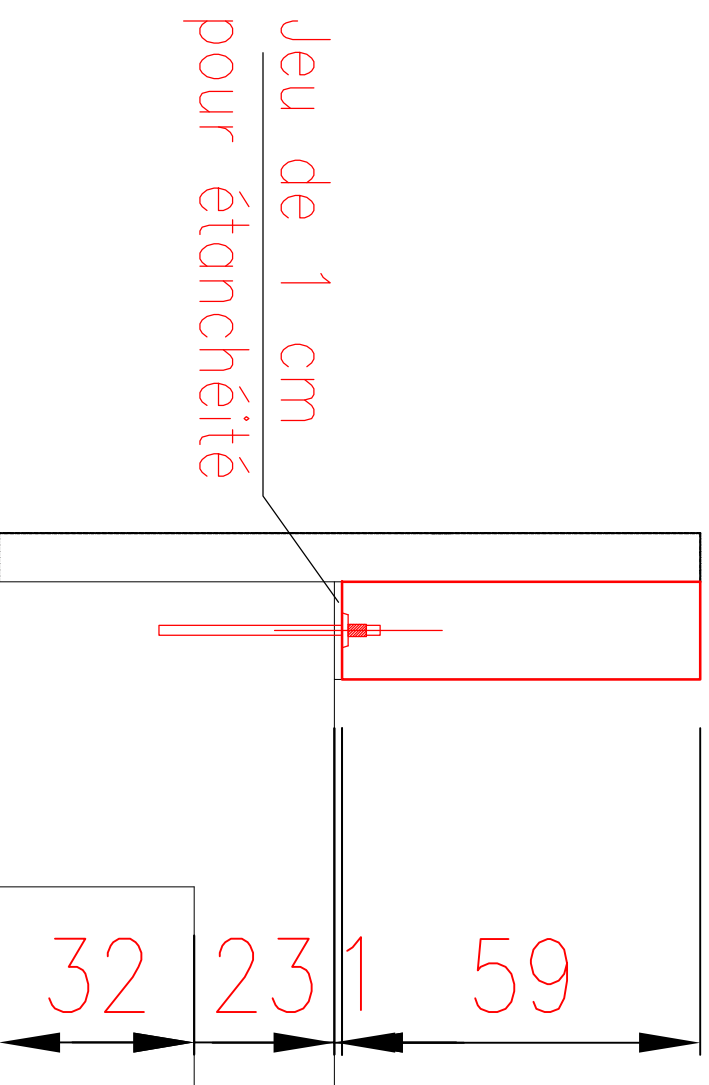

LE 180 - LA MULATIERE

BANDEAU TYPE S

NIVEAU 1

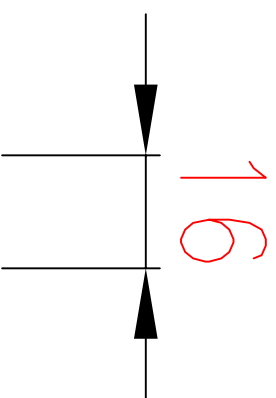

10




56

Cadres HA6 e=20

2 Filants HA10





6 Filants HA8

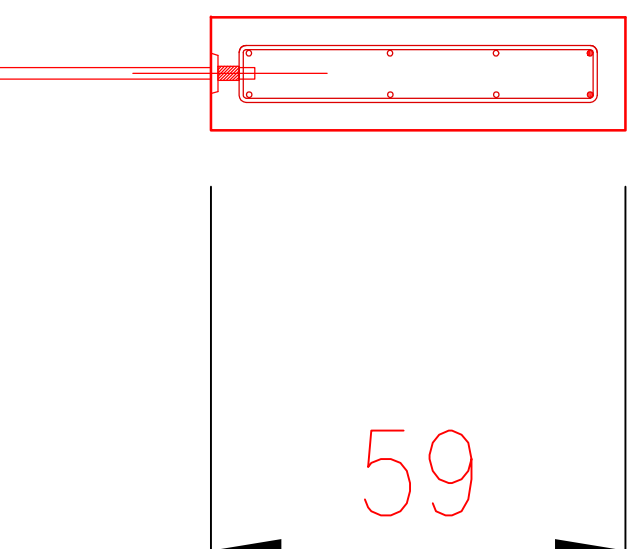

MOULE	N	NC	observations	CONTROLE	N	NC	observations	BETON	N	NC	observations	FICHE AUTO-CONTROLE
Conformité moule				Dimensions				Conformité béton				Opérateur :
Etat du moule				Armature				Mise en place				Responsable prod :
Propreté et huilage				Inserts				Aspect de surface				Date :



Ent. FONTANEL			Elément: BANDEAUX		FICHE DE FABRICATION			Surface: m²		POIDS		REPERE	Nbr
LE 180 - LA MULATIERE			coffrage		PLATTARD S.A.S.			Volume: 0.34 m3		0.83 T		S1	1

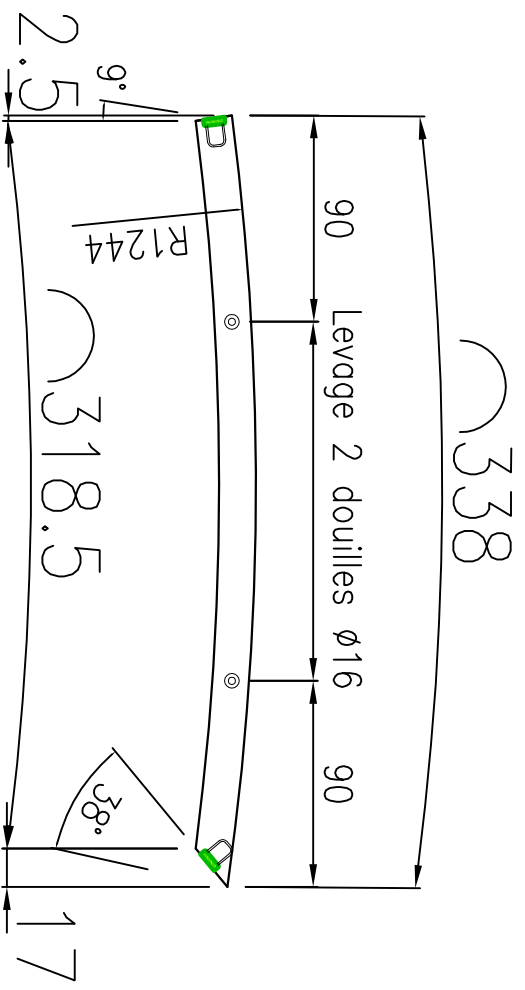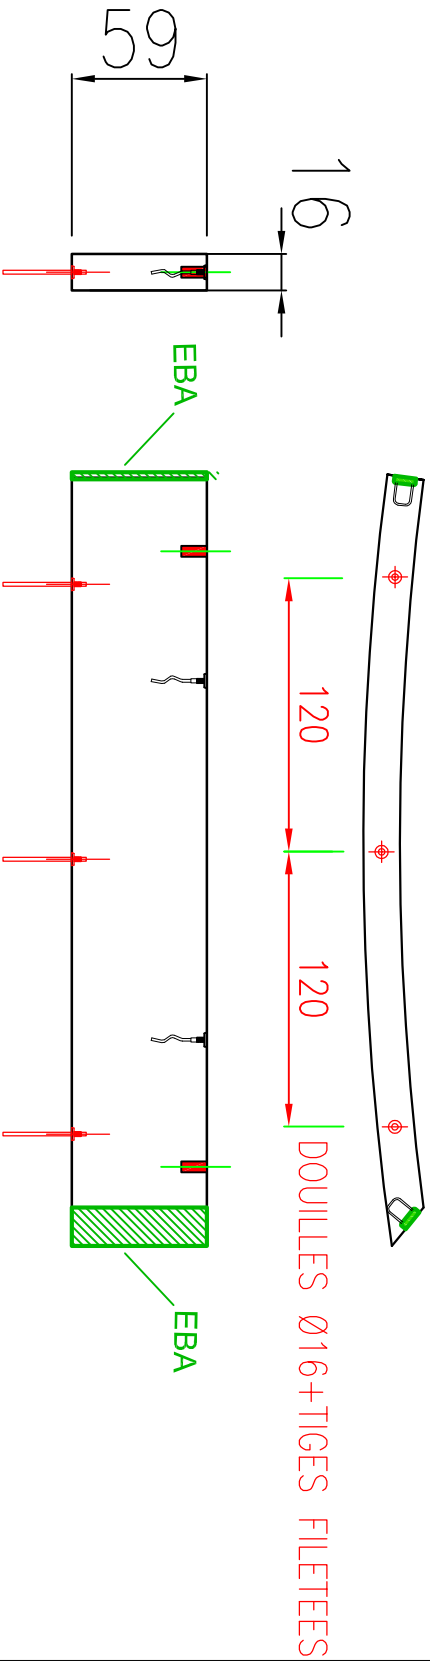

LEVAGE				INSERTS				INSERTS				INSERTS			
	Douille Ø				Ancre Frimeda T				EBA				TP - JV		DATE: 16/11/2015
	Douille Ø				Renfort Ø				Douille étalement				PVC Ø80		Plan N°
	Renfort Ø dx				Trifier				Ankrobox Ø50				Tube garde-corps		Indice

MOULE	N	NC	observations	CONTROLE	N	NC	observations	BETON	N	NC	observations	FICHE AUTO-CONTROLE
Conformité moule				Dimensions				Conformité béton				Opérateur :
Etat du moule				Armature				Mise en place				Responsable prod :
Propreté et huilage				Inserts				Aspect de surface				Date :

Ent. FONTANEL			Elément: BANDEAUX			FICHE DE FABRICATION			Surface:	m²	POIDS	REPERE	Nbr
LE 180 - LA MULATIERE			coffrage			PLATTARD S.A.S.			Volume:	0.32	m3	0.76	T
												S2	
												1	

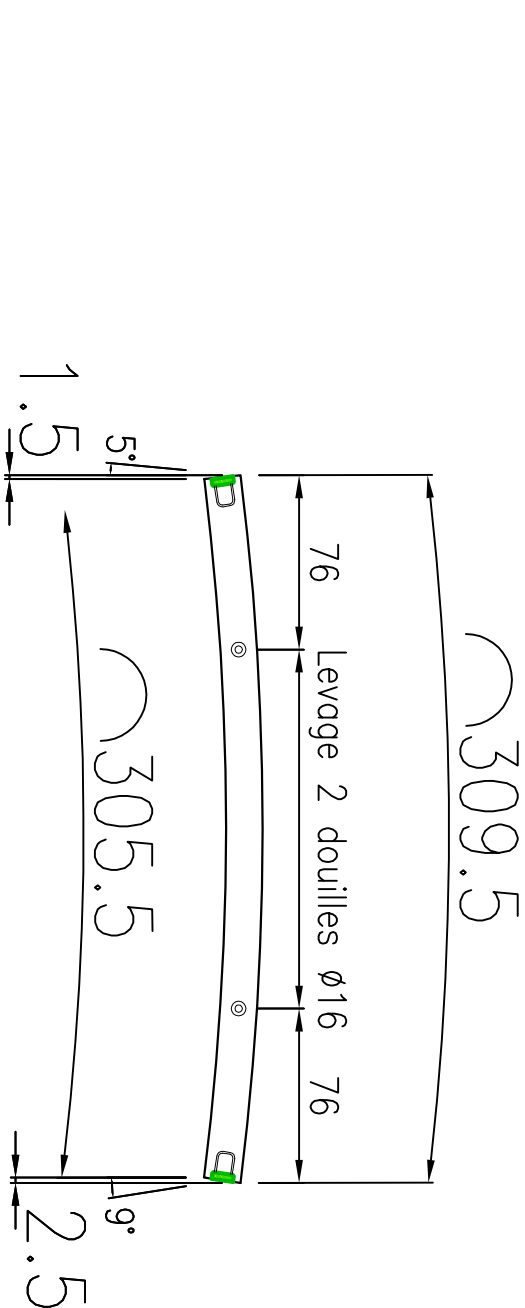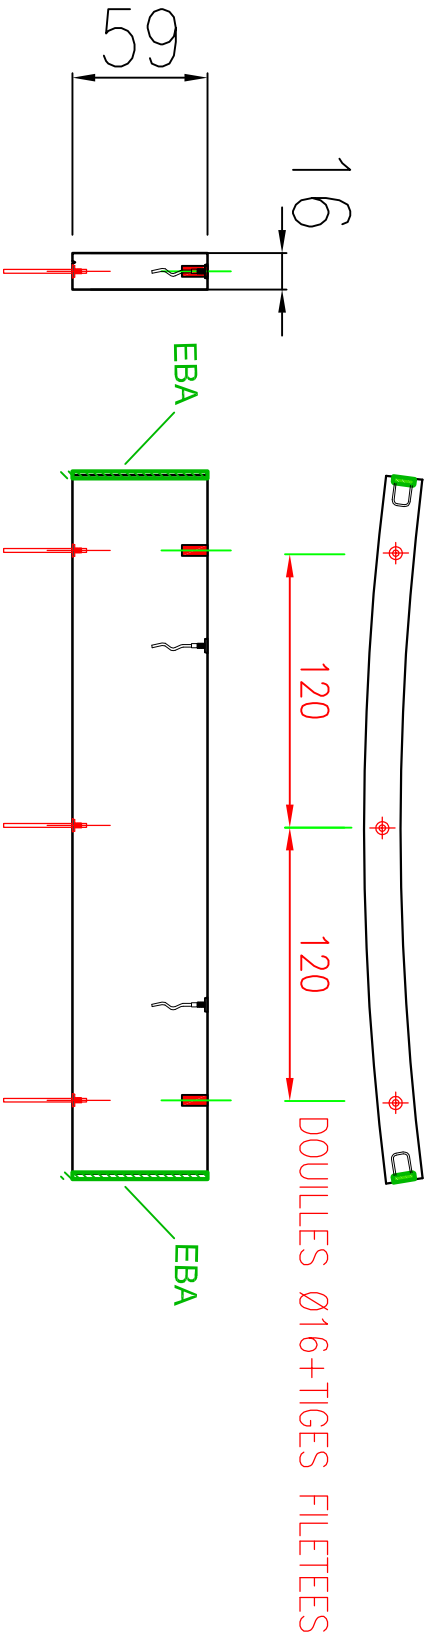



LEVAGE			INSERTS			INSERTS			INSERTS		
	Douille Ø			Ancre Frimeda T			EBA			TP - JV	DATE: 16/11/2015
	Douille Ø			Renfort Ø			Douille étalement			PVC Ø80	Plan N°
	Renfort Ø dx			Trifier			Ankrobox Ø50			Tube garde-corps	Indice
									Page N°		

MOULE	N	NC	observations	CONTROLE	N	NC	observations	BETON	N	NC	observations	FICHE AUTO-CONTROLE
Conformité moule				Dimensions				Conformité béton				Opérateur :
Etat du moule				Armature				Mise en place				Responsable prod :
Propreté et huilage				Inserts				Aspect de surface				Date :

Ent. FONTANEL		Elément: BANDEAUX		 PLATTARD S.A.S. FICHE DE FABRICATION		Surface: m²		POIDS		REPERE		Nbr	
LE 180 - LA MULATIERE		coffrage				Volume: 0.13 m3		0.310 T		S3		1	



DOUILLES Ø16+TIGES FILETEES

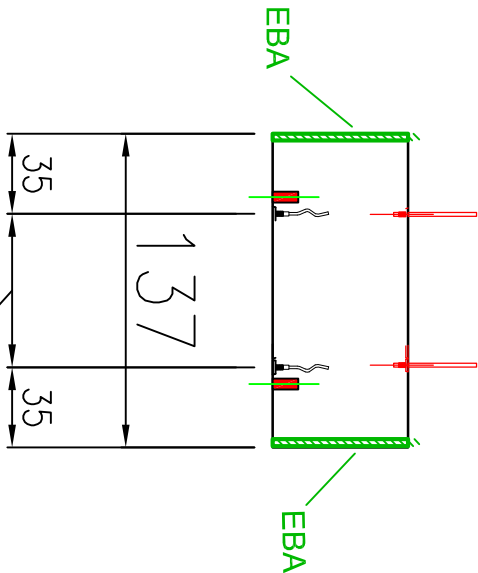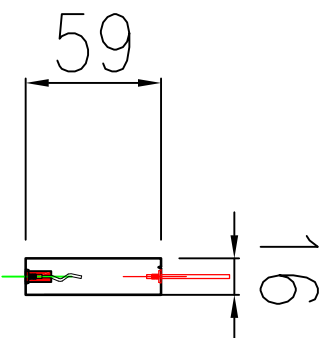

Levage 2 douilles Ø16



LEVAGE				INSERTS				INSERTS				INSERTS			
	Douille Ø				Ancre Frimeda T				EBA				TP - JV	DATE: 16/11/2015	
	Douille Ø				Renfort Ø				Douille étalement				PVC Ø80	Plan N°	Page N°
	Renfort Ø dx				Trifier				Ankrobox Ø50				Tube garde-corps	Indice	

MOULE	N	NC	observations	CONTROLE	N	NC	observations	BETON	N	NC	observations	FICHE AUTO-CONTROLE
Conformité moule				Dimensions				Conformité béton				Opérateur :
Etat du moule				Armature				Mise en place				Responsable prod :
Propreté et huilage				Inserts				Aspect de surface				Date :

Ent. FONTANEL				Elément: BANDEAUX				FICHE DE FABRICATION				Surface: m²		POIDS		REPERE		Nbr	
LE 180 - LA MULATIERE				coffrage				PLATTARD S.A.S.				Volume: 0.310 m3		0.740 T		S4		1	



DOUILLES Ø16+TIGES FILETEES


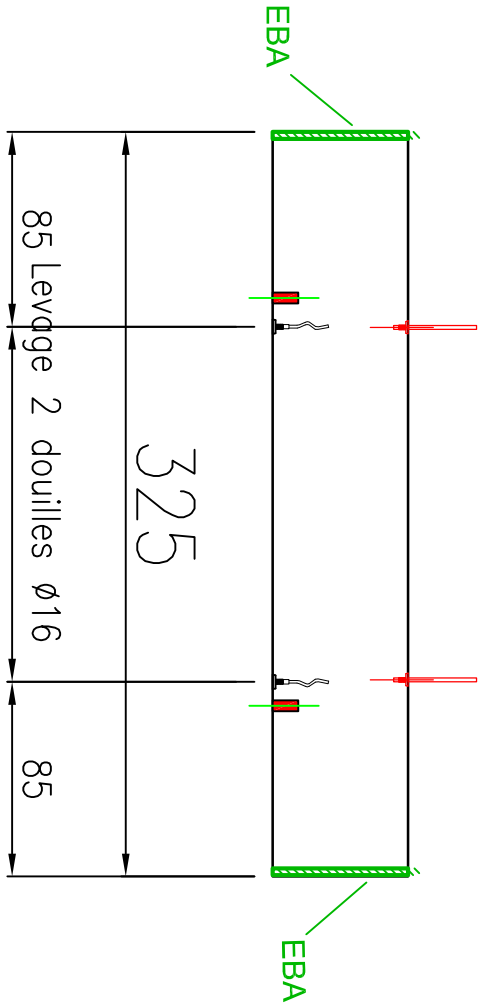
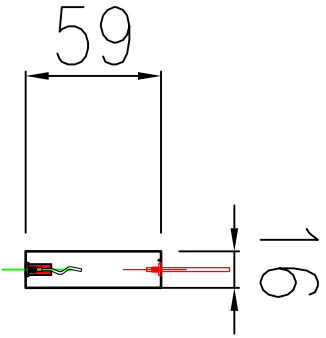


LEVAGE									
	Douille Ø								
	Douille Ø								
	Renfort Ø dx								
INSERTS									
	Ancre Frimeda T								
	Renfort Ø								
	Tritter								
INSERTS									
	EBA								
	Douille étalement								
	Ankrobox Ø50								
INSERTS									
	TP - JV								
	PVC Ø80								
	Tube garde-corps								
	Indice								
DATE: 16/11/2015									
Plan N°		Page N°							

Ent. FONTANEL	
Elément: BANDEAUX	
coffrage	
 PLATARD SAS	
FICHE DE FABRICATION	
Surface: m²	POIDS
Volume: 0.310 m³	0.740 T
REPERE	
Nbr	
S5	
1	

LE 180 - LA MULATIERE

DOUBLES Ø16+TIGES FILETEES

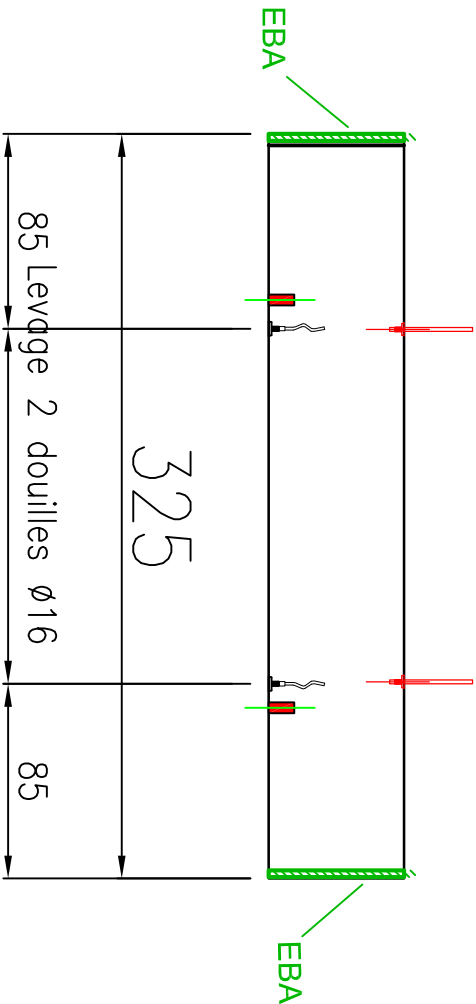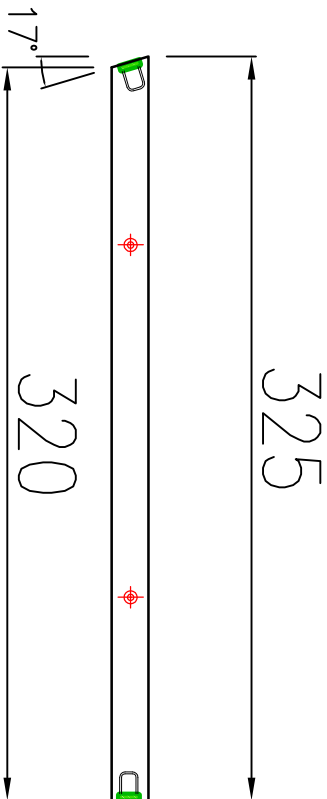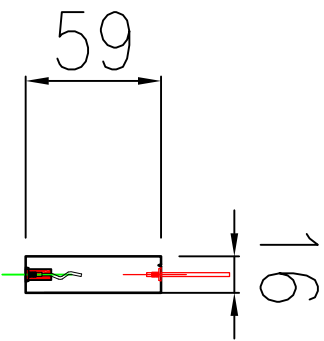

LEVERAGE									
	Douille Ø	Renfort Ø	dx						
	Douille Ø								
	Renfort Ø	dx							
INSERTS									
	Ancre Frimeda T								
	Renfort Ø								
	Tifiter								
INSERTS									
	EBA								
	Douille étalement								
	Ankrobox Ø50								
INSERTS									
	TP - JV								
	PVC Ø80								
	Tube garde-corps								
	Indice								
DATE: 16/11/2015									
Plan N°		Page N°							
